

# Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	01 / 2026
Objektnr. / Projekt	11-4 / Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern _ Modulbau - Außenanlagen 2. BA
Projektleitung	Wolfgang Nettelbeck
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

## PROJEKTSTATUS

Nachdem der Modulbau fertiggestellt und Ende 2025 bezogen sowie die Außenanlagen des 1. BA abgeschlossen wurden, ist derzeit die Ausschreibung für die Außenanlage des 2. BA ist auf dem Markt.

## PROJEKTÄNDERUNG

-/-

## PROJEKTAUSBLICK


Das Submissionsergebnis soll in der Sitzung der Betriebskommission am 28.05.2026 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Außenanlagenarbeiten des 2. BA sollen im Juni 2026 beginnen.

## PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				
KG 200			30.000	30.000
KG 300				
KG 400			9.450.000	9.450.000
KG 500			760.000	760.000
KG 600				
KG 700			1.260.000	1.260.000
<b>Summe</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.500.000</b>

\* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan

Da das Modulgebäude im Komplettpaket mit sämtlichen technischen Anschlüssen beauftragt und geliefert wird, wurden die Kosten der Gruppen 300 und 400 zusammen ermittelt und unter KG 400 eingetragen.

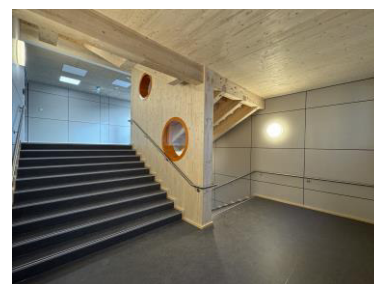

Modulbau



Innenansicht Klassenraum



Außenanlage 1. BA



Außenanlagenplanung 2BA

## Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	01 / 2026
Objektnr. / Projekt	11-4 / Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern _ Modulbau - Außenanlagen 2. BA
Projektleitung	Wolfgang Nettelbeck
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

### PROJEKTTERMINE

Planungsbeginn	01/2024
Abschluss Lph 3	03/2024
Einreichung Bauantrag	01/2025
Fertigstellung Gebäude	10/2025
Fertigstellung / Übergabe an Nutzende	12/2025
Fertigstellung Außenanlage 1. BA	10/2025
Fertigstellung Außenanlage 2. BA	12/2026
