

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	04 / 2025 Abschlussbericht
Objektnr. / Projekt	18-3 / Gutenbergschule, Pfungstadt _ Modulbau
Projektleitung	Kai Trietsch / Valentina Guizzetti
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

PROJEKTSTATUS

Der Modulbau wurde durch die Schule im September 2025 bezogen. Die Außenanlagen/GaLa-Bauarbeiten sind noch im Gange.

PROJEKTÄNDERUNG

-/-

PROJEKTAUSBLICK

Die Außenanlagen werden im laufenden Schulbetrieb bis voraussichtlich zum Jahresbeginn 2026 durchgeführt. Die Außenbeleuchtung wird komplett über die e-netz Südhessen geplant und ausgeführt. Es ist vorgesehen, die momentan vorhandenen Mastleuchten zu versetzen, bzw. durch neue Mastleuchten zu ergänzen. Die Herstellung der Gräben, die Verlegung von Kabeln und Warnbändern, das Verschließen der Gräben und die Fundamentherstellung für die Mastleuchten sind Leistungen des GaLa-Bauunternehmens und derzeit im Gange.


PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100			0	0
KG 200			170.000	170.000
KG 300			3.590.000	3.590.000
KG 400			1.300.000	1.300.000
KG 500			1.200.000	1.200.000
KG 600			0	0
KG 700			1.100.000	1.100.000
Summe	7.500.000	7.500.000	7.360.000	7.360.000

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan



Inneneinrichtung 1

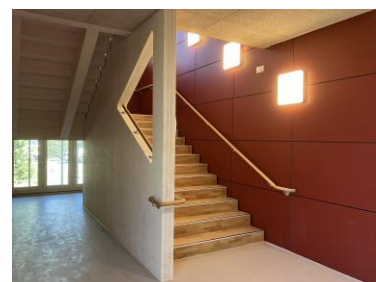

Inneneinrichtung 2



Rückbau Pavillon

Projektstatusbericht



Da-Di-Werk
Gebäudemanagement

Quartal / Jahr	04 / 2025 Abschlussbericht
Objektnr. / Projekt	18-3 / Gutenbergschule, Pfungstadt _ Modulbau
Projektleitung	Kai Trietsch / Valentina Guizzetti
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

PROJEKTTERMINE

Planungsbeginn	03/2022
Abschluss Lph 3	06/2023
Einreichung Bauantrag	07/2023
Fertigstellung Rohbau	03/2025
Baubeginn Modulbau	05/2025
Fertigstellung / Übergabe an Nutzende	08/2025
Fertigstellung Außenanlage	02/2026



Außenanlage 1



Außenanlage 2
