

Quartal / Jahr	02 / 2026
Objektnr. / Projekt	18-9 / Helene-Weber-Schule, Pfungstadt; Schule für geistige Entwicklung - 2. BA
Projektleitung	Dipl.-Ing. Jutta Heyd
Architekt / in	Schulgebäudeerweiterung in Holzmodulbauweise, Fa. ERNE

PROJEKTSTATUS

Der Innenausbau ist weitestgehend abgeschlossen.

Die Küchen in den Klassenräumen wurden eingebaut und werden in Kürze angeschlossen.

Die Abstimmungen zur Wandgestaltung der Flure sind erfolgt. In den Flurnischen befinden sich die Garderoben für die Kinder. Diese Bereiche sollen mit fotorealistischen Tapeten betont und aufgelockert werden. Für das Erdgeschoss wurde das Motiv eines Birkenwaldes gewählt, während im Obergeschoss ein Unterwassermotiv umgesetzt wird.

PROJEKTÄNDERUNG

Die Außenanlagen haben sich leider zeitlich etwas verschoben, nicht zuletzt, weil das Gelände um den neuen Gebäudeabschnitt noch von den Ausbaufirmen als Lagerfläche genutzt werden musste. Alle Technik- und Ausbaugewerke waren gleichzeitig beschäftigt und haben Hand in Hand gearbeitet. Der enge Bereich um das Gebäude wurde dabei permanent mitgenutzt.

PROJEKTAUSBLICK

Mit Beginn der Sommerferien 2026 können die Umbauarbeiten im Bestand vorgenommen werden. Der Bereich der Verwaltung wird neu organisiert, da mit der gestiegenen Zahl von Schülerinnen und Schülern auch die Anzahl der Pädagoginnen und Pädagogen steigt und eine stellvertretende Schulleitung hinzukommt.

Weitere Ausstattungen wie Feuerlöscher, Seifen- und Handtuchspender werden in Kürze aufgehängt. Auch die Wandgestaltungen in den Fluren werden im Laufe der Sommerferien umgesetzt.

In den ersten drei Ferienwochen erfolgen die technischen Anschlüsse und die Abnahmen der Gewerke.

Die Lieferung der Möbel und der Umzug der Schulmaterialien aus dem Bestand erfolgen in der vierten und fünften Ferienwoche, so dass danach die Pädagoginnen und Pädagogen in der letzten Woche die Räume in Betrieb nehmen können und rechtzeitig zum Schulbeginn nach den Ferien alle Kinder in die Räume einziehen können.

Ab Juli 2026 wird mit den Arbeiten im Bereich der Außenanlagen begonnen.



Ansicht Ost, von den Bestandsgebäuden aus gesehen



Ansicht Nord und West



Ansicht Süd



Küchenzeilen in den Klassenräumen

Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	02 / 2026
Objektnr. / Projekt	18-9 / Helene-Weber-Schule, Pfungstadt; Schule für geistige Entwicklung - 2. BA
Projektleitung	Dipl.-Ing. Jutta Heyd
Architekt / in	Schulgebäudeerweiterung in Holzmodulbauweise, Fa. ERNE


PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				
KG 200				
KG 300			4.100.000	4.400.000
KG 400			1.500.000	1.500.000
KG 500			350.000	350.000
KG 600				
KG 700			710.000	410.000
Summe	2.000.000	22.500.000	6.660.000	6.660.000


Die Kosten der KG 200 und Teile der KG 500, sowie 700 sind in der KG 300 und KG 400 enthalten und werden über den Auftrag Fa. ERNE abgerechnet.

PROJEKTTERMINE


Planungsbeginn intern	04/2025
Planungsbeginn mit externen Planungsbüros	08/2025
Modulproduktion	08/2025
Modulmontage vor Ort	02/2026
Fertigstellung / Übergabe Gebäude an Nutzende	07/2026
Fertigstellung Außenanlagen (Bepflanzung)	10/2026

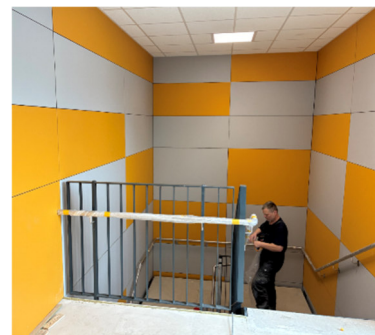

Treppenhaus

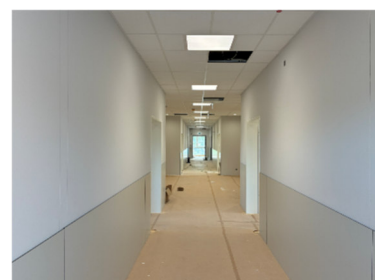

Flur im Anbau



Wandgestaltungen Flurnischen
