

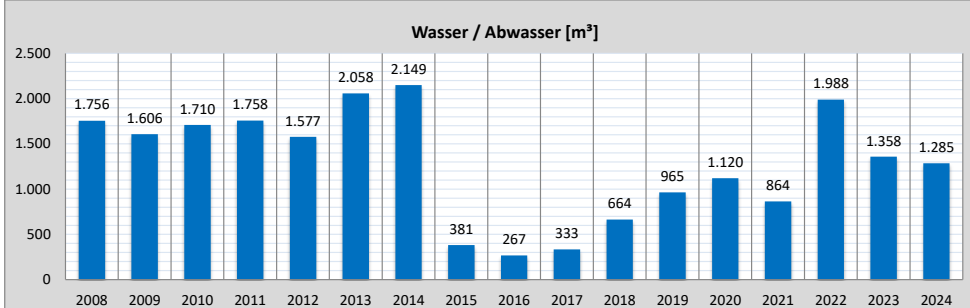


# Schuldatenblatt

## Energieverbrauch und -kosten

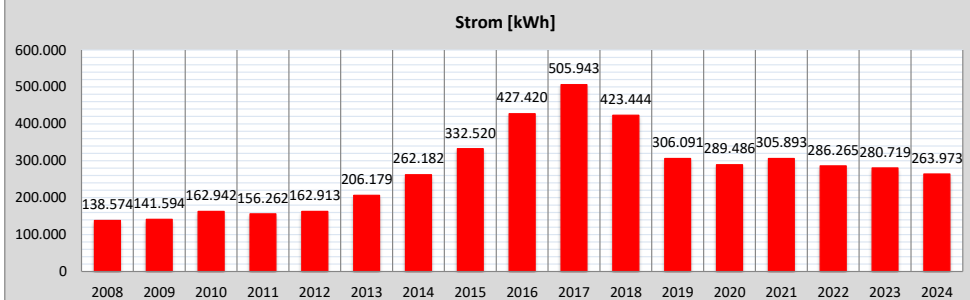

|               |                                                              |           |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Schule        | Albrecht-Dürer-Schule                                        | Schul-Nr. | 23-5 |
| Straße, Nr.   | Klein-Gerauer Weg 23 - 25                                    |           |      |
| Stadt         | 64331 Weiterstadt                                            |           |      |
| Schulform(en) | Schulformbezogene (Kooperative) Gesamtschule (Sek. I und II) |           |      |

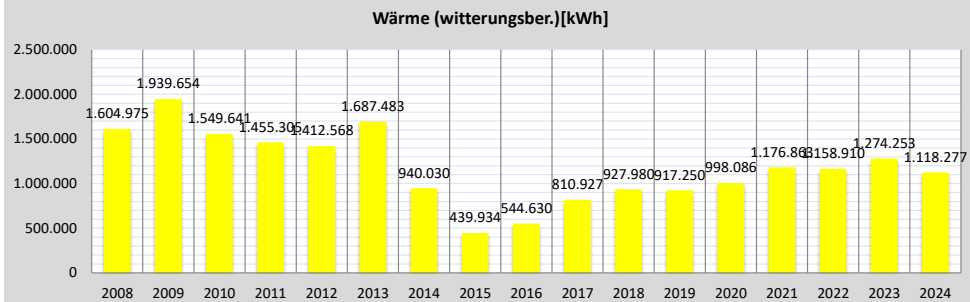

| Jahr | Verbrauch         |                         |                |                             | Kosten         |                |                              |
|------|-------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
|      | Wärme             |                         | Strom<br>[kWh] | Wasser/<br>Abwasser<br>[m³] | Wärme<br>[EUR] | Strom<br>[EUR] | Wasser/<br>Abwasser<br>[EUR] |
|      | gemessen<br>[kWh] | witterungsber.<br>[kWh] |                |                             |                |                |                              |
| 2008 | 1.352.014         | 1.604.975               | 138.574        | 1.756                       | 90.150         | 18.153         | 12.749                       |
| 2009 | 1.601.432         | 1.939.654               | 141.594        | 1.606                       | 110.291        | 22.118         | 10.905                       |
| 2010 | 1.517.768         | 1.549.641               | 162.942        | 1.710                       | 94.743         | 20.827         | 11.839                       |
| 2011 | 1.120.241         | 1.455.305               | 156.262        | 1.758                       | 89.310         | 25.446         | 11.357                       |
| 2012 | 1.232.177         | 1.412.568               | 162.913        | 1.577                       | 96.532         | 27.195         | 11.035                       |
| 2013 | 1.553.565         | 1.687.483               | 206.179        | 2.058                       | 107.797        | 39.217         | 13.193                       |
| 2014 | 698.543           | 940.030                 | 262.182        | 2.149                       | 54.806         | 52.124         | 11.841                       |
| 2015 | 356.453           | 439.934                 | 332.520        | 381                         | 26.239         | 61.048         | 4.418                        |
| 2016 | 455.567           | 544.630                 | 427.420        | 267                         | 22.755         | 83.102         | 4.179                        |
| 2017 | 672.801           | 810.927                 | 505.943        | 333                         | 34.096         | 101.750        | 2.367                        |
| 2018 | 696.577           | 927.980                 | 423.444        | 664                         | 31.233         | 88.947         | 5.655                        |
| 2019 | 731.109           | 917.250                 | 306.091        | 965                         | 40.905         | 68.155         | 6.680                        |
| 2020 | 751.118           | 998.086                 | 289.486        | 1.120                       | 35.368         | 68.501         | 6.635                        |
| 2021 | 1.033.514         | 1.176.863               | 305.893        | 864                         | 54.966         | 72.194         | 5.543                        |
| 2022 | 862.476           | 1.158.910               | 286.265        | 1.988                       | 68.855         | 58.667         | 10.903                       |
| 2023 | 907.717           | 1.274.253               | 280.719        | 1.358                       | 63.505         | 102.320        | 5.787                        |
| 2024 | 815.487           | 1.118.277               | 263.973        | 1.285                       | 69.952         | 92.958         | 8.045                        |

### Maßnahmen (Jahr der Fertigstellung)

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 2009        | Errichtung Anbau                                 |
| 2012        | Errichtung eines Biomassekessels                 |
| 2011        | Beteiligung an Adam-Danz-Halle                   |
| 2013 - 2018 | Sanierung Hauptgebäude                           |
| 2014 - 2018 | Auslagerung der Schule in Container              |
| 2018        | Abriss Pavillon                                  |
| 2020        | Errichtung Gebäude 09                            |
| 2022        | Aufstockung Gebäude 09                           |
| 2022        | hoher Wasserverlust durch defekte Hygienespülung |
